

类别：建设类项目

编号：_____

宁 216H32 平台地面集输工程 水土保持方案报告表

送 审 单 位：四川长宁天然气开发有限责任公司
法 定 代 表 人：赵松
地 址：四川省成都市成华区猛追湾横街 99 号世贸大厦
联 系 人：辛蓓蓓
电 话：13980022711
送 审 时 间：2024 年 3 月

中华人民共和国水利部

宁 216H32 平台地面集输工程水土保持方案报告表

项目概况	位置	四川省宜宾市珙县沐滩镇犀牛山村			
	建设内容	在宁 216H32 平台钻井工程、宁 217 井平台钻井工程上建设地面工程 1 座，设计规模为 $4 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。			
	建设性质	新建	总投资（万元）	545	
	土建投资（万元）	320		占地面积（ m^2 ）	
					永久：0.55 临时：0
	动工时间	2024 年 7 月		完工时间	2024 年 12 月
	土石方（ m^3 ）	挖方	填方	借方	余（弃）方
		3200	3200	0	0
	取土（石、砂）场	无			
弃土（石、砂）场	无				
项目区概况	涉及重点防治区情况	沱江下游省级水土流失重点治理区	地貌类型	丘陵地貌	
	原地貌土壤侵蚀模数 [$\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$]	250	容许土壤流失量 [$\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$]	500	
项目选址（线）水土保持评价	本项目位于四川省宜宾市珙县，选址（线）无法避让沱江下游省级水土流失重点治理区，方案执行水土流失防治标准西南岩溶区建设类项目一级标准（最高级）标准；不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；也不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区国家确定的水土保持长期定位观测站。选址符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）相关规定。				
预测水土流失总量	本方案预测水土流失量约 17t。				
防治责任范围（ m^2 ）	5500				
防治标准等级及目标	防治标准等级	西南岩溶区建设类项目一级标准			
	水土流失治理度(%)	97	土壤流失控制比	1.0	
	渣土防护率(%)	92	表土保护率(%)	/	
	林草植被恢复率(%)	96	林草覆盖率(%)	/	

水土保持措施	<p>一、主体工程防治区</p> <p>施工中：方案新增彩条布对砂石料堆放表面、管沟开挖临时堆土、裸露地表进行覆盖。</p> <p>各项水土保持措施如下：</p> <p>临时措施：彩条布 2500m²。</p>			
	工程措施	2.20	植物措施	0
水土保持投资估算（万元）	临时措施	1.69	水土保持补偿费	0.72（7150元）
	独立费用	建设管理费	投资	0.03
		水土保持监理费	投资	0
		设计费	投资	8.75
	总投资	14.44		
编制单位	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	建设单位	四川长宁天然气开发有限责任公司	
法定代表人及电话	欧凯	法定代表人及电话	赵松	
地址	重庆市渝中区长江二路179号	通讯地址	四川省成都市成华区猛追湾横街99号世贸大厦	
邮编	400016	邮编	610056	
联系人及电话	田太强/18883355220	联系人及电话	辛蓓蓓/13980022711	
电子信箱	34038089@qq.com	电子信箱	/	
传真	023-68725084	传真	/	

宁 216H32 平台地面集输工程
水土保持方案报告表

设计说明书

建设单位：四川长宁天然气开发有限责任公司

编制单位：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

2024 年 3 月

目录

1 项目简述	1
1.1 项目基本概况.....	1
1.2 项目由来及前期工作情况.....	2
1.3 项目组成及工程布置.....	3
1.4 施工组织.....	4
1.5 工程占地.....	5
1.6 土石方平衡.....	5
1.7 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建.....	6
1.8 施工进度.....	6
1.9 水土流失执行标准等级及水土流失防治目标.....	6
1.10 方案编制阶段.....	7
1.11 设计水平年.....	7
2 项目区概述	8
2.1 自然概况.....	8
2.2 水土流失及水土保持.....	10
3 水土流失分析与预测	12
3.1 水土流失影响因素分析.....	12
3.2 土壤流失量预测.....	12
3.3 水土流失危害分析.....	15
3.4 指导性意见.....	15
4 水土保持措施	16
4.1 防治区划分.....	16
4.2 措施总体布局.....	16
4.3 分区防治措施布设.....	17
4.4 施工要求.....	18
5 水土保持投资估算及效益分析	21
5.1 投资估算.....	21

5.2 效益分析	30
6 水土保持管理	33
6.1 组织管理	33
6.2 后续设计	33
6.3 水土保持监测	33
6.4 水土保持监理	33
6.5 水土保持施工	34
6.6 水土保持设施验收	34
7 结论及建议	36
7.1 结论	36
7.2 建议	36
8 附表、附件和附图	37
8.1 附表	37
8.2 附件	37
8.3 附图	37

1 项目简述

1.1 项目基本情况

1.1.1 项目名称及性质

宁 216H32 平台地面集输工程，新建项目。

1.1.2 建设单位

四川长宁天然气开发有限责任公司。

1.1.3 地理位置及交通条件

本工程位于四川省宜宾市珙县沐滩镇犀牛山村，项目沿线可依托交通条件主要依托乡道及新农村路网及井场道路，交通便利，施工条件良好。

1.1.4 建设内容

本工程是在宁 216H32 平台钻井工程、宁 217 井平台钻井工程上合建地面工程 1 座，设计规模为 $4 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。主要建设内容包括集输工艺区、设备区、井口区、预留压缩机区、消防棚、风向标、缓蚀剂加注撬、预留压缩机箱变、返排液池、井场内巡检道路。

1.1.5 工程投资

工程总投资为万元 545 万元，其中，土建投资 320 万元。

1.1.6 建设工期

本工程计划建设工期为 2024 年 7 月至 2024 年 12 月，共 6 个月。

1.1.7 主要技术经济指标

工程总体技术经济指标见表 1.1-1。

1 项目简述

表 1.1-1 工程总体技术经济指标

一、项目概况							
项目名称	宁 216H32 平台地面集输工程			建设地点	四川省宜宾市珙县		
建设单位	四川长宁天然气开发有限责任公司			建设性质	新建项目		
工程投资	545 万元			土建投资	320 万元		
建设工期	2024 年 7 月至 2024 年 12 月			工程占地	0.55hm ²		
主要建设内容及规模	在宁 216H32 平台钻井工程、宁 217 井平台钻井工程上合建地面工程 1 座，设计规模为 4×10 ⁴ m ³ /d。						
施工条件	施工便道	沿线交通条件较好，不设置。					
	施工水电	工程所需施工供水主要为施工人员生活用水，依托居民房自有设施；供电主要依托当地供电。					
二、工程占地							
序号	项目	面积 (hm ²)		占地类型及用地性质			
1	主体工程	0.55		工矿及仓储用地，永久占地 0.55hm ²			
	合计	0.55					
三、土石方工程 (单位: 万 m ³)							
工程区	挖方			填方			余方
	表土	其它	小计	表土	其它	小计	
主体工程		0.12	0.12		0.12	0.12	
总计		0.12	0.12		0.12	0.12	

1.2 项目由来及前期工作情况

1.2.1 项目由来

根据西南油气田分公司《川南页岩气勘探开发阶段成果及加快发展设想》的总体目标，按集团公司加快中国石油页岩气业务发展步伐的要求，以“整体部署、分步实施、滚动评价、动态调整”为部署思路，加快产业化示范区建设工作。力争建立并完善页岩气评价体系和勘探模式，实现主要装备实现自主化生产，形成系列页岩气技术标准和规范，建立完善页岩气产业政策体系，完善页岩气工厂化生产模式，水平井组钻探、压裂、压裂后微地震监测技术成熟，开发工艺设备实现国产，页岩气年产量达到再上新台阶。

根据《关于公长宁页岩气田年产 50 亿立方米产能建设稳产方案的批复》(石油计划〔2020〕77 号)，2021-2022 年批复新钻井 84 口，本项目位于珙县沐滩镇犀牛山村，该工程的建成对实现长宁气田稳产 50×10⁸m³/a 的目标起到重要作

用。

1.2.2 前期工作情况

2024年1月，珙县发展和改革局下发了《宁216H32平台地面集输工程投资项目备案表》；

2023年8月，四川岚强石油天然气工程勘察设计有限责任公司编制完成了《宁216H32平台地面集输工程施工图设计》。

1.2.3 本工程与宁216H32平台钻井工程的关系

本工程（宁216H32平台地面集输工程）为新建项目，本工程集输工艺区、设备区、井口区、预留压缩机区、消防棚、风向标、缓蚀剂加注撬、预留压缩机箱变、返排液池、井场内巡检道路均在宁216H32平台钻井工程和宁217平台钻井工程井站范围内建设。

原工程基本情况：原宁216H32平台钻井工程和已建宁217井平台钻井工程包含井站及其附属工程，216H32平台钻井工程为4口井，宁217井平台钻井工程为1口井，建设内容包括储备灌、操作平台、井场、耕植土堆放区等。工程于2023年10月开工，工程开工前编报了水土保持方案，施工过程中沿井场周边修建了浆砌砖排水沟，该项目正在同步开展水土保持编制工作。

本次地面工程建设将直接利用原原宁216H32平台钻井工程和已建宁217井平台配套道路和临时活动房。本工程排水可直接利用原钻井工程布设的排水沟。

1.3 项目组成及工程布置

1.3.1 项目组成

本工程是在已建的宁216H32平台钻井工程上建设地面工程1座，主要由井场地面工程组成，主要建设内容包括集输工艺区、设备区、井口区、预留压缩机区、消防棚、风向标、缓蚀剂加注撬、预留压缩机箱变、返排液池、井场内巡检道路，设计规模为 $4 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。

1.3.2 总平面布置

新建平台井站按照无人值守设计，部分井站前期考虑临时有人值守。平台

前场一侧布置工艺区和预留增压区，工艺区距离井口间为不小于 5m，增压区与井口间距不小于 20m；仪控房和箱式变电站设置前场另一侧，距离井口间距约 15m。后场设置气田水罐区和站场临时检维修放空区，气田水罐区与井口间距为不小于 10m。井场四周设置钢丝网围墙与外界分隔开。平台井新建的建构筑物的防火间距严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的防火间距要求设置。

1.3.3 竖向布置及排水

本工程依托宁 216H32 平台钻井工程建设，平台地面高程为 934.1 m~934.4 m，本次设计标高为 934.4m。

本平台利用钻前场地排水，同时在宁 217 平台围栏外侧修建砖砌排水沟排水，排水沟为矩形，宽 40cm，深 15cm，站场雨水散排至站场围墙的泄水孔排至站外原有的排水系统。本工程不再新建排水系统，

1.3.4 进场道路

本平台依托原有井场公路，站内采用原有的硬化场地作为车行道。

1.4 施工组织

1.4.1 施工场地

原宁 216H32 平台钻井工程于 2023 年 10 月开工建设，原钻井工程在井场东南侧布置了活动板房作为施工生产生活区。经现场踏勘，并与业主沟通，考虑到后期要进行地面工程建设，本着少扰动地表的原则，原钻井工程完工时活动板房未拆除。

因此，本工程不单独设施工生产区，施工均在占地范围内进行。生活区直接利用原工程布置的活动板房。

1.4.2 施工道路

本项目沿线有乡道及新农村路网及井场道路，交通便利，施工条件良好，不需新建施工便道。

1.4.3 施工水电

工程所需施工供水主要为施工人员生活用水，依托居民房自有设施；供电主要依托当地供电。

1.4.4 建筑材料

本工程所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材、管道等可从珙县内采购获得，通过公路运至项目区。工程建设中外购的土石料，在购买合同中应明确料场水土流失防治责任由供货方负责。本工程不设置料场。

1.5 工程占地

经水保方案复核，本工程总占地面积 0.55hm^2 ，全部为永久占地。占地类型为工矿仓储用地。本方案复核后的工程占地情况见表 1.5-1，工程占地性质见表 1.5-2。

表 1.5-1 工程占地类型情况表（单位： hm^2 ）

序号	工程区	工矿及仓储用地	合计
2	主体工程区	0.55	0.55
	总计	0.55	0.55

表 1.5-2 工程占地性质（单位： hm^2 ）

序号	工程区	临时用地	永久用地	合计
1	主体工程	0	0.55	0.55
	合计	0	0.55	0.55

1.6 土石方平衡

1.6.1 表土工程

根据现场调查，本工程占地范围内无可剥离的表土。

1.6.2 土石方总体平衡

根据施工图资料并咨询施工单位，根据主体设计，工程土石方主要源于管道开挖和回填夯实。

经复核，工程总挖方 0.12万 m^3 ，工程总填方 0.12万 m^3 ，无余方。土石方平衡表见表 1.6-1。

本方案中除特别说明外，土石方平衡分析中，土石方全部换算成自然方统计。

表 1.6-1 土石方平衡表（单位：万 m^3 ，自然方）

序号	项目区	挖方	填方	余方
1	主体工程	0.12	0.12	
	合计	0.12	0.12	

1 项目简述




图 1.6-1 土石方流向图 (单位: m³)

1.7 拆迁 (移民) 安置与专项设施改 (迁) 建

本工程不涉及拆迁安置及专项设施改 (迁) 建。

1.8 施工进度

工程建设总工期为 6 个月，2024 年 7 月至 2024 年 12。施工进度安排见表 1.8-1。

表 1.8-1 施工进度表

时间项目	2024 年					
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
施工准备	—					
设备基础开挖	—					
设备安装	—					
验收						—

1.9 水土流失执行标准等级及水土流失防治目标

1.9.1 执行标准等级

本工程为建设类项目，位于四川省宜宾市珙县，根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188 号），项目区不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区。

根据《四川省水利厅关于印发〈四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果〉的通知》（川水函〔2017〕482 号），珙县属于沱江下游省级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），水土流失防治应按西南岩溶区建设类项目一级标准执行。

1.9.2 防治目标

(1) 定性目标

1 项目简述

项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复。

(2) 定量目标

本工程为建设类项目，防治标准按施工期和设计水平年 2 个时段分别确定，并根据原地貌土壤侵蚀强度、所处位置进行修正。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本工程水土流失治理度、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率不做调整。由于工程原地貌土壤侵蚀强度以轻度为主，土壤流失控制比不应小于 1.0，本工程取 1.0。此外，本工程无法避让“沱江下游省级水土流失重点治理区”，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，林草覆盖率应提高 1%~2%，本工程提高 2%。

本工程是在已建的宁 216H32 平台钻井工程上建设地面工程，工程占地范围内无可剥离的表土，因此表土保护率不予取值。因井场不宜恢复为林草地，因此，本工程施工完后占地范围内无林草面积，林草覆盖率不予取值。

经修正后，本工程水土流失防治目标见表 1.9-1。

表 1.9-1 防治目标计算表

防治指标	规范标准		按土壤侵蚀强度调整	按涉及中山区调整	按无法避让水土流失重点治理区调整	采用标准	
	施工期	设计水平年				施工期	设计水平年
水土流失治理度(%)	—	97				—	97
土壤流失控制比	—	0.85	+0.15			—	1.0
渣土防护率(%)	90	92				90	92
表土保护率(%)	95	95				—	—
林草植被恢复率(%)	—	96				—	96
林草覆盖率(%)	—	21			+2	—	—

1.10 方案编制阶段

本方案编制阶段为可研阶段。

1.11 设计水平年

本工程建设工期为 2024 年 7 月至 2024 年 12 月，本方案设计水平年为主体工程完工后当年，即 2024 年。

2 项目区概述

2.1 自然概况

2.1.1 地形地貌

珙县位于四川盆地南缘，境内为中山、低山地貌，县境北部，东部起伏较小，分布大小不等的山间盆地和河谷平原。

本工程所在位置属丘陵地貌，原地貌以为工矿及仓储用地。现状标高 934.1 m ~ 934.4 m，高差约 0.3m，坡度小于 5°。

2.1.2 地质概况

(1) 地质构造

珙县位于扬子准地台区，北为四川中凹陷区的川东南褶皱束及川中隆起，南为滇黔褶皱区之娄山关凹陷褶皱束及雷波隆起，属较稳定地块。

工程场地地质构造简单，构造作用相对较弱，地层产状较平缓，地层分布稳定，构造平缓，场区及外围无区域性断裂通过，区域构造稳定，场地稳定性较好。

(2) 地层岩性

项目区地层自上而下为嘉陵江组、飞仙关组等地层。

表 2.1-1 工程地层分层数据表

层位	底界深度 (m)	岩性简述
嘉陵江组	466	云岩、膏质云岩、灰白色石膏、云质石膏，下部紫色灰质泥岩、浅灰褐色灰岩、含泥灰岩、泥质灰岩。
飞仙关组	966	紫色、紫红色、灰绿色泥岩、砂质泥岩夹浅灰褐色灰质泥岩、泥晶泥质灰岩，灰褐色泥质砂岩
长兴组	1011	上部黑灰色、灰黑色页岩夹灰色灰质泥岩、灰色铝土质泥岩，深灰色、灰色凝灰质粉砂岩，玄武岩、煤线；下部为灰色铝土质泥岩，深灰色凝灰质粉砂岩，灰黑色页岩、砂质页岩。
龙潭组	1191	
茅口组	1541	褐灰色~深褐灰色灰岩、含云质灰岩、砂屑灰岩、粒屑灰岩；黑灰色灰岩、泥质灰岩，含泥灰岩
栖霞组	1661	浅灰褐色灰岩、含云质灰岩
梁山组	1666	页岩
韩家店组	1886	泥岩夹砂岩、粉砂岩
石牛栏组	2286	灰绿色页岩夹薄层灰岩
龙马溪组	2726	深灰色页岩、褐灰色泥质灰岩、深灰色灰岩、泥质灰岩，黄绿泥岩、黑灰色、黑色碳质页岩

(3) 水文地质

项目区水文地质条件较简单，原始地形有利于地下水沿基岩面排泄。地下水类型可分为基岩裂隙水和碎屑岩类孔隙裂隙水两大类型，主要受大气降水及地表水的影响。

(4) 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版），工程基础抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。根据《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89），项目区属抗震有利地段。

(5) 不良地质

项目区未见活动性断裂、危岩（崩塌）、泥石流、地面塌陷、沉降、地裂缝等不良地质现象，地质构造简单，岩土层位连续稳定，无溶穴、破碎带、软弱夹层分布。

2.1.3 气象

项目区所在地属亚热带湿润季风气候，低丘、河谷地带有南亚热带的气候属性，具有气候温和、热量丰足、雨量充沛、光照适宜、无霜期长、冬暖春早、四季分明的特点。多年年平均气温17.1℃左右，多年年平均降水量1346mm，5月~10月为雨季。项目区主要气象指标见表2.1-2。

表 2.1-2 项目区主要气象指标

项目	单位	指标值	项目	单位	指标值
多年年平均气温	℃	17.1	多年年平均降雨量	mm	1346
年极端最高温度	℃	41.4	多年年平均蒸发量	mm	997.1
年极端最低温度	℃	-1.6	年最大蒸发量	mm	1211.6(2001)
年平均相对湿度		81%	年平均日照时数	h	1147.8
年平均风速	m/s	1.1	无霜期	d	334~360
年最大风速	m/s	32	主导风向	/	WNW, NW

2.1.4 水文

项目区属于长江流域南广河水系，位于南广河支流邓家河右岸。项目区雨水通过排水沟进入当地自然冲沟后汇入邓家河，再通过南广河最终汇入长江。

2.1.5 土壤

珙县土壤母质比较复杂，有石灰岩风化物、紫色页岩和泥岩合成风化物、黄石砂岩风化物、沿河冲积物等等。形成的土壤类型也比较多，主要有水稻土、

潮土、紫色土、黄壤、石灰土、山地黄棕壤等六大类。

根据现场踏勘，项目区土壤主要为紫色土。紫色土由砂岩、泥岩发育而成，矿质养分丰富，有机质含量少，酸碱度因岩性不同差异较大，呈中性或微碱性，紫色土土壤可蚀性因子为 0.0184。表层土壤厚度一般为 0.2~0.3m。

2.1.6 植被

珙县属亚热带地区，亚热带常绿阔叶林区，由于人类活动的影响，现存原始植被较少，大部分为人工植被和原始植被的次生植被。

经调查和现场踏勘，工程用地范围内占地类型为工矿及仓储用地，无林草植被。

2.1.7 场址涉及敏感区域情况

经初步调查并结合地勘、环评等资料情况，本工程沿线地质构造较稳定，没有发现滑坡、泥石流等自然灾害，不涉及水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、城镇规划区、工业园区等。

2.2 水土流失及水土保持

2.2.1 项目区所属防治分区

本工程为建设类项目，根据《四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知（川水函[2017]482号）》，珙县属于沱江下游省级水土流失重点治理区。

2.2.2 项目区水土流失情况

（1）珙县水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区在全国土壤侵蚀分区里属于西南土石山区，水土流失类型主要为水力侵蚀（面沟和沟蚀），容许土壤流失量为 500t/（km²·a）。根据《《全国水土保持区划》（2015-2030年）中划定，珙县属于西南岩溶区（VII）-滇黔桂山地丘陵区（VII-1）-滇黔川高原山地保土蓄水区（VII-1-2tx）。

（2）项目区水土流失现状

本工程水土流失现状采用实地调查和图纸量测相结合的方法进行。首先采用实地调查法获得土地利用现状和水土流失现状图斑，然后根据地形、坡度、植被覆盖度等指标，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）的土壤侵

蚀强度分级标准和面蚀分级指标，结合专家估判法，划分和确定其水土流失强度，并计算其原地貌土壤侵蚀模数。

土壤侵蚀强度分级标准见表 2.2-1，面蚀分级指标见表 2.2-2。

表 2.2-1 土壤侵蚀强度分级标准表

侵蚀级别	平均侵蚀模数 (t/(km ² ·a))	平均流失厚度 (mm/a)
微度侵蚀	< 500	< 0.37
轻度侵蚀	500 ~ 2500	0.37 ~ 1.9
中度侵蚀	2500 ~ 5000	1.9 ~ 3.7
强烈侵蚀	5000 ~ 8000	3.7 ~ 5.9
极强度侵蚀	8000 ~ 15000	5.9 ~ 11.1
剧烈侵蚀	> 15000	> 11.1

表 2.2-2 土壤侵蚀强度分级指标表

地面坡度 (°)		5° ~ 8°	8° ~ 15°	15° ~ 25°	25° ~ 35°	>35°
非耕地林草覆盖度 (%)	60 ~ 75	轻度				
	45 ~ 60					强烈
	30 ~ 45	中度			强烈	极强烈
	<30			强烈	极强烈	剧烈
坡耕地		轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈

经计算分析，本工程用地范围内原地貌土壤侵蚀模数为 250t/(km²·a)，年流失量 1.38t。工程用地范围土壤侵蚀模数背景值计算见表 2.2-3。

表 2.2-3 工程区水土流失背景情况表

工程区名称	土地利用现状	林草植被覆盖度 (%)	地面坡度 (°)	侵蚀等级	侵蚀模数范围 (t/km ² ·a)	本方案取值 (t/km ² ·a)	面积 (hm ²)	年均侵蚀量 (t)
主体工程	工矿仓储用地	/	/	微度水力侵蚀	<500	250	0.55	1.38

注：根据《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007 进行项目区土壤侵蚀强度分级。

3 水土流失分析与预测

3.1 水土流失影响因素分析

工程建设过程中,造成水土流失的因素主要包括侵蚀外营力和工程建设施工,侵蚀外营力主要有降水、重力等;工程建设施工改变了侵蚀外营力与土壤抗侵蚀力之间的自然相对平衡,加剧了水土流失。

3.2 土壤流失量预测

3.2.1 预测单元

水土流失预测的范围为项目建设区,面积 0.55hm^2 ,包括主体工程施工单元。

3.2.2 预测时段

根据工程建设特点,工程可能产生的水土流失量应按施工准备期、施工期、自然恢复期三个时段进行预测即可。由于施工准备期较短,因此将施工准备期纳入施工期一并预测,故水土流失预测时段分施工期、自然恢复期两个时段。

结合工程单元施工进度安排、产生水土流失的季节,工程单元期预测时段按土建施工时段占年内雨季时段的比例计算,本工程施工期时段为 2024 年 7 月至 2024 年 12 月,本方案从不利角度考虑取 0.6 年。

自然恢复期是指单元工程施工扰动结束后,不采取水土保持措施的情况下,土壤侵蚀强度逐步减弱并达到或接近原背景值所需的时间。本工程场地除构筑物占压外已全部硬化,因此,本工程不进行自然恢复期调查。

本工程水土流失预测时间段详见表 3.2-1。

表 3.2-1 水土流失预测时段及面积统计表

序号	工程区	施工准备及施工期		自然恢复期	
		预测面积 (hm^2)	预测时段 (a)	预测面积 (hm^2)	预测时段 (a)
1	主体工程	0.55	0.6	/	/
	总计	0.55	/	/	/

3.2.3 土壤侵蚀模数

(1) 土壤侵蚀模数确定

① 施工期土壤侵蚀模数

类比工程选取类比工程选择“太阳集气站及集气管道工程(建产期)”。该

工程于 2021 年 6 月由中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司天然气勘探开发事业部组织进行了水土保持设施验收,中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司于 2021 年 5 月对太阳集气站及集气管道工程(建产期)进行了水土保持回顾性监测,并完成了水土保持监测总结报告。两工程类比条件如下表所示。

表 3.2-2 类比分析表

项目	拟建项目	太阳集气站及集气管道工程(建产期)
地理位置	四川省宜宾市珙县	四川省宜宾市叙永县
土壤侵蚀类型区	西南土石山区	西南土石山区
土壤侵蚀方式	水力侵蚀为主	水力侵蚀为主
气候	项目区属亚热带湿润季风气候,多年平均降水量 1346mm。降雨一般集中在 5 月~9 月	项目区属亚热带湿润季风气候,多年平均降水量 1172.6mm。降雨一般集中在 5 月~9 月
土壤	紫色土	紫色土
植被	亚热带常绿针叶林带和常绿阔叶林带	亚热带常绿针叶林带和常绿阔叶林带
地形、地貌	中山、低山地貌	中山、低山地貌
水土保持概况	以水力侵蚀为主,侵蚀方式主要为面蚀、沟蚀,工程区原生土壤侵蚀模数 250t/km ² ·a),为微度侵蚀	以水力侵蚀为主,侵蚀方式主要为面蚀、沟蚀,项目区原生土壤侵蚀模数 1903t/(km ² ·a),为轻度侵蚀
施工工艺	均为管道工程,施工工艺相同	

由上表可以看出,拟建项目与太阳集气站及集气管道工程(建产期)在地形地貌、水土流失方式、土壤及植被、工程施工工艺以及气候等几个水土流失影响因子相比较可以看出,对比的各项因子相同或相类似。因此,拟建项目施工期土壤侵蚀模数可以直接类比太阳集气站及集气管道工程(建产期)土壤侵蚀模数。

根据类比工程监测成果:站场工程土壤侵蚀模数为 5000t/(km²·a)。

自然恢复期侵蚀模数第一年土壤侵蚀模数取值 2500t/(km²·a),第二年土壤侵蚀模数取值 2200t/(km²·a)。

②本工程土壤侵蚀模数的确定

根据类比工程,本工程施工期土壤侵蚀模数参照太阳集气站及集气管道工

程（建产期）进行取值。本工程施工期及自然恢复期土壤侵蚀模数取值情况见 3.2-3。

表 3.2-3 各预测单元土壤侵蚀模数一览表（单位：t/（km²·a））

序号	工程区	施工期侵蚀模数	自然恢复期侵蚀模数	
			第一年	第二年
2	主体工程	5000	2500	2200

3.2.4 预测结果

（1）预测方法

对工程建设可能造成的土壤流失量预测是水土流失预测的核心部分，较准确地预测土壤流失量，便于水土流失防治体系的确定和水土保持措施的设计，以达到综合防治项目区水土流失的目的。

工程扰动地表可能造成土壤流失量采用《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）推荐的经验公式进行预测，具体计算公式如下：

$$W = \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^n F_{ji} \times M_{ji} \times T_{ji}$$

式中：W—土壤流失量（t）；

J—预测时段，j=1，2，即指施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段；

i—预测单元，i=1，2，3，…，n-1，n；

F_{ji} —第 j 预测时间、第 i 预测单元的面积（km²）；

M_{ji} —第 j 预测时间、第 i 预测单元的土壤侵蚀模数[t/(km²·a)]；

T_{ji} —第 j 预测时间、第 i 预测单元的预测时段长（a）。

（2）预测结果

本工程建设可能产生水土流失总量 1，新增水土流失量 16t。其中。水土流失量预测情况见表 3.2-4~表 3.2-5。

表 3.2-4 施工期水土流失预测表

序号	预测单元	背景侵蚀模数 (t/(km ² ·a))	施工期土壤侵蚀模数 (t/(km ² ·a))	预测面积 (hm ²)	预测时间 (a)	背景流失 (t)	预测流失 (t)	新增流失量 (t)
2	主体工程	250	5000	0.55	0.6	1	17	16
	总计	/	/	0.55	/	1	17	16

表 3.2-5 水土流失量汇总表

时期	背景流失量	预测流失量	新增流失量
施工期	1	17	16
自然恢复期	/	/	/
合计	1	17	16

新增水土流失量为 17t，全部发生在施工期，本工程主要流失区域为主体工程区。

3.3 水土流失危害分析

根据以上预测结果，本工程在建设过程中，将扰动原地貌、破坏植被，大大加剧项目区水土流失，其危害主要表现在以下几个方面。

(1) 对土地资源和土地生产力的影响分析

本工程扰动、破坏原地貌面积 0.55hm²，大面积挖填施工将减少土地资源，降低土地生产力。

(2) 对周边环境的影响分析

本工程在建设过程中挖填施工、土石方堆置将完全损坏原有地貌，并且如施工不能有效控制施工红线，对周边其它区域仍可能存在较大影响，如造成大量水土流失，也将对周边区域形成冲刷、泥沙堆积，破坏生态环境和景观效果。

3.4 指导性意见

由项目区水土流失特点及工程建设可能造成水土流失预测结果分析，可能造成水土流失主要集中在施工期。因此，本方案对本工程水土流失防治措施的布设提出以下几点意见。

第一，预防为主、保护优先。合理调配土石方，尽量做到“即挖即填”，减少临时堆放，填方区域做到“先挡后填”，减少水土流失源，从源头上预防和控制水土流失。管线应根据地形情况分段进行施工，并做好各施工段间的协调工作，开挖土石方进行纵向调配，做到工程内部消化土方，不产生弃方。

第二，施工过程中采取必要的临时防护措施。水土流失重点时段是施工期，在施工期间，由于施工工序的限制，部分水土保持工程措施和植物措施无法即时实施。因此，采取临时覆盖等措施，对于防治施工期间的水土流失具有十分重要的作用。

4 水土保持措施

4.1 防治区划分

(1) 分区目的

进行水土流失防治分区，其目的在于合理布设措施，便于分区进行水土保持工程典型设计，并根据分区进行措施工程量统计以及投资估算。

(2) 分区依据

根据实地调查（勘测）结果，在确定的防治责任范围内，依据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区。

(3) 分区原则

确定水土流失防治分区主要遵循以下原则：A、各区之间应具有显著差异性；B、同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；C、根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；D、一级区应具有控制性、整体性、全局性，线型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区，二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；E、各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

(4) 分区结果

本工程即包含点型工程又包含线型工程，属于丘陵地貌，水土流失类型均为水力侵蚀。本方案将工程分为 1 个水土流失一级防治分区：主体工程防治区。水土流失防治分区见表 4.1-1。

表 4.1-1 水土流失防治分区表

序号	一级分区	二级分区	项目建设区 (hm ²)			防治责任面积 (hm ²)	备注
			永久占地	临时占地	小计		
1	主体工程防治区		0.55	0	0.55	0.55	
	合计		0.55	0	0.55	0.55	

4.2 措施总体布局

4.2.1 主体工程防治区


施工中：方案新增彩条布对砂石料堆放表面、管沟开挖临时堆土、裸露地表进行覆盖，施工后期沿围栏外侧修建砖砌排水沟。

水土流失防治措施体系表见表 4.2-1，水土流失防治措施体系框图见图 4.2-1。

表 4.2-1 水土流失防治措施体系表

一级分区	水土保持措施		
	工程措施	植物措施	临时措施
主体工程防治区	排水沟	/	彩条布

注：加粗字体为主体已列水土保持措施

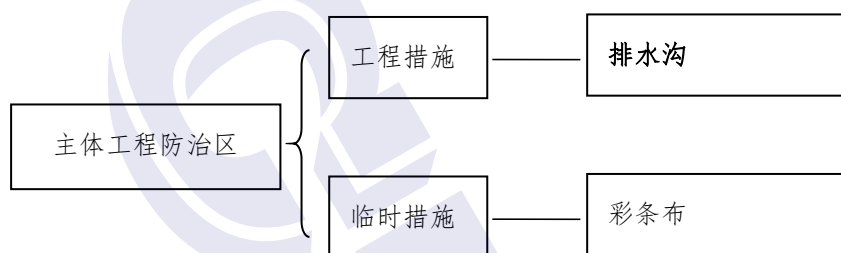

注：加粗字体为主体已列水保措施

图 4.2-1 水土流失防治措施体系框图

4.3 分区防治措施布设

4.3.1 预防保护措施

根据《中华人民共和国水土保持法》提出的“预防为主、保护优先”的水土保持方针，本工程水土保持工作应首先考虑预防措施。结合项目类型的工程特性和实际建设情况，本方案重点提出（但不限于）以下预防保护的管理要求。

（1）加强建设单位和施工单位以及相关人员的水土保持法律法规学习，增强法制观念，提高水土保持意识。

（2）施工单位应选择合理的施工时间，尽量避开雨季施工。若不能避开，对新开挖面采用相应的水土保持措施，防止水土流失。

（3）施工单位要严格控制施工用地，禁止在工程范围外随意取土、弃土、开挖等施工活动。

（4）施工单位要优化施工工序，挖填施工应及时衔接，尽量减少临时堆放土石方，减少地表裸露时间。

（5）开挖时应避免在雨季施工，要严格控制施工用地，禁止在工程范围

外随意取土、弃土、开挖等施工活动，做好开挖土石方临时防护工作。

4.3.2 主体工程防治区

(1) 工程措施

主体工程施工后期沿围栏外侧修建砖砌排水沟，排水沟宽 40cm，深 15cm，总计长度为 139m。

(2) 临时措施

方案新增彩条布对砂石料堆放表面、管沟开挖临时堆土、裸露地表进行覆盖。条布主要起到临时覆盖的作用，边角用块石压实，防止彩条布被风吹落。经统计，共布置彩条布 2500m²。

(3) 主体工程防治区水土保持措施工程量汇总

主体工程防治区水土保持措施工程量汇总表见表 4.3-1。

表 4.3-1 主体工程防治区水土保持措施工程量汇总表

序号	项目名称	单位	主体设计	方案新增	合计
1	工程措施				
1.1	排水沟	m	139		139
1	临时措施				
1.1	彩条布	m ²		2500	2500

4.3.3 防治措施工程量汇总

本工程水土保持措施为临时措施，工程量见表 4.3-2。

表 4.3-3 工程措施工程量表

序号	项目名称	单位	主体设计	方案新增	总工程量
一	主体工程防治区				
1	排水沟	m	139		139

表 4.3-3 临时措施工程量表

序号	项目名称	单位	主体设计	方案新增	总工程量
一	主体工程防治区				
1	彩条布	m ²		2500	2500

4.4 施工要求

4.4.1 水土保持施工组织总体思路

为了及时有效防治工程在建设过程中造成的水土流失，根据工程基本建设计划安排，有计划、有组织、有步骤地治理水土流失，对具体的水保工程实行

集体承包或分包，签订施工合同，使水保工程与主体工程建设同时施工，并同时竣工验收及投产使用。

4.4.2 施工条件

(1) 施工生活区、场内外交通

水土保持工程的施工生活区、交通、供水、供电及通讯条件皆与主体工程统一部署。

(2) 施工用水、用电

水土保持工程施工用电利用主体工程施工用电条件，施工用水利用主体工程供水条件。

(3) 主要材料供应

水土保持措施所需草籽、彩条布等材料全部纳入主体工程材料采购计划，在市场上统一择优采购，以保证质量、降低成本。

4.4.3 施工组织原则

施工过程中应本着少占地、少扰动的原则布置措施，避免因水土保持工程建设而造成另外的水土流失；因地制宜就地取材，节约原材料，降低工程成本。

4.4.4 施工方法

彩条布临时覆盖：人工覆盖。

4.4.5 水土保持措施施工进度安排

水土保持工程设计实际进度与工程基本建设进度一致，水土保持各项措施与主体工程建设同时施工，同时投产使用，结合主体工程施工进度安排，制定本水土保持工程的实施进度，详细安排见表 4.4-1。

表 4.4-1 水土保持措施施工进度表

项目		分区及措施工程量	2024 年					
			7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
一、主体工程防治区								
工程措施	主体设计	排水沟 139m					
临时措施	方案新增	彩条布 2500m ²

注：—— 主体工程进度 水保措施进度

5 水土保持投资估算及效益分析

5.1 投资估算

5.1.1 编制原则及依据

(1) 编制原则

水土保持工程估算由工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费、独立费用五部分及预备费和水土保持补偿费构成。本方案投资估算编制原则如下：

①水土保持投资估算的价格水半年、人工单价、主要材料价格、施工机械台时费、估算定额，取费项目及费率应与主体工程一致。

②主体工程估算定额中未明确的，应采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率。

(2) 编制依据

《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2003年）

《开发建设项目水土保持工程概（估）算定额》（2003年）

《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格[2007]670号）

《工程勘察设计收费标准》（2002年）

《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格[2007]670号）

《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）

《水利部办公厅关于印发水利工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知》（办水总[2016]132号）

《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）

《四川省财政厅四川省发展和改革委员会四川省水利厅中国人民银行成都分行关于印发〈四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法〉的通知》（川财综[2014]6号）

《四川省水利厅关于发布<四川省水利水电工程概（估）算编制规定>的通知》（川水发[2015]9号）

《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（2015年）

《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格[2017]347号）

《四川省水利厅关于印发 增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知》（川水函[2019]610号）

5.1.2 编制说明与估算成果

本方案水土保持工程投资估算深度按可研阶段深度要求进行。估算水平年与主体工程设计一致，以2023年第3季度价格为准。

5.1.2.1 基础单价编制说明

（1）人工预算单价

本方案工程措施人工预算单价为24.75元/工时，植物措施人工预算单价为18.25元/工时。项目区海拔在2000m以下，人工工时及机械台时不做海拔系数调整。

（2）材料预算价格

材料价格=（材料原价+运杂费）×（1+采购及保管费费率）+运输保险费。材料采购及保管费费率为2.8%，其中苗木、草、种子采购及保管费费率为0.6%~1.1%。对于主体工程中已有的材料预算价格在进行估算时与主体设计一致，主体工程中未涉及的材料预算价格参考市场价格确定。当计算的预算价格超过基价时，应按基价计入工程单价参加取费，超过部分以价差形式计算，列入单价表并计取税金。材料基价见表5.1-1。

表 5.1-1 材料基价表

序号	材料名称	单位	基价（元）	序号	材料名称	单位	基价（元）
1	柴油	t	3000	6	商品混凝土	m ³	200
2	汽油	t	3100	7	砂、卵石（碎石）、条石、块石	m ³	70
3	钢筋	t	2600	8	苗木	株	15
4	水泥	t	260	9	草	m ²	10
5	炸药	t	5200	10	种子	kg	60

（3）施工用电、水、风预算价

施工用电、用水预算价均与主体工程一致，预算价分别为 1.20 元/(kw·h)、3 元/m³。

(4) 施工机械使用费

施工机械使用费根据《水土保持工程概算定额》附录中的施工机械台时费定额计算（以不含相应增值税进项税额的基础价格计算）。其中，施工机械台时费定额的折旧费除以 1.15 调整系数，修理及替换设备费除以 1.11 调整系数，安装拆卸费不变。

(5) 砂石料单价

外购砂、碎石（砾石）、块石、料石等采用工程所在地附近市场成交价格加采购地点至工地的运杂费计算。

(6) 混凝土单价

根据设计确定的不同工程部位的混凝土标号、级配和龄期，分别计算出每立方米混凝土材料单价（包括水泥、掺和料、砂石料、外加剂和水），计入相应的混凝土工程单价内。其混凝土配合比的各项材料用量，应根据工程试验提供的资料计算；无试验资料时，参照《水土保持工程概算定额》附录中的混凝土材料配合比表计算。

5.1.2.2 建筑、安装工程单价编制说明

(1) 工程单价及费率

对于主体设计概算已有的单价，本方案将直接引用。对于缺乏的工程措施、植物措施单价按照《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总[2003]67号）以及《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2015年）规定进行计算。工程措施与植物措施单价由直接费（包括基本直接费、其他直接费）、间接费、利润和税金组成。

①直接费

由基本直接费、其他直接费两部分组成。

A、基本直接费

基本直接费由人工费、材料费和机械使用费组成。人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）；材料费=定额材料用量×材料预算单价；机械

使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费。

B、其他直接费

其他直接费=基本直接费×其它直接费费率。包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、安全和文明施工费、其他等5项组成。其中，冬雨季施工增加费、夜间施工增加费（植物措施、机载固沙、土地整治工程不计此项）、其他费率、临时设施费（植物措施费率按相应主体工程标准50%执行）按相应主体工程标准执行，安全和文明施工费按基本直接费的2%计算。

②间接费

间接费=直接费×间接费费率。间接费费率按相应主体工程标准执行（注：植物措施按相应主体工程的土方工程费率标准执行）。

③企业利润

工程措施、植物措施、监测措施按直接费和间接费之和的7%计算。

④税金

税金=（直接费+间接费+价差+利润）×计算税率。按《四川省水利厅关于印发 增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知》（川水函[2019]610号）计取，即为9%。

⑤单价

单价 = （直接费+间接费+企业利润+价差+税金）×1.1。

综上，本工程单价组成及计算依据见表5.1-2。人工费、材料费和机械使用费定额按《开发建设项目水土保持工程概（估）算定额》（2003年）相关工程定额计取。其他直接费、间接费、企业利润的费率标准按《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（2015年）计取。税金费率标准按《四川省水利厅关于印发 增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知》（川水函[2019]610号）计取。本工程使用费率取值见表5.1-3。

表 5.1-2 工程单价组成及计算依据

序号	项目			计算依据
1	直接费	基本直接费	人工费	定额劳动量×人工预算单价(元/工时)
			材料费	工程措施: 定额材料用量×材料预算单价 植物措施: 定额材料用量×材料预算单价
			机械使用费	定额机械使用量(台时)×施工机械台时费
		其他直接费	基本直接费×其他直接费率	
2	间接费			直接费×间接费率
3	企业利润			(直接费+间接费)×企业利润率
4	价差			当材料价格超过基价时, 超过部分以价差形式计算
5	税金			(直接费+间接费+价差+利润)×计算税率
6	扩大费			(直接费+间接费+企业利润+价差+税金)×10%
	工程单价			直接费+间接费+企业利润+价差+税金+扩大费

表 5.1-3 单价费率标准(单位: %)

项目	其他直接费	间接费	企业利润	税金
一、工程措施				
土石方工程	2	5	7	9
土地整治工程	2	3.3	7	9
混凝土工程	2	4.3	7	9
基础处理工程	2	6.5	7	9
其他工程	2	4.4	7	9
二、植物措施	1	3.3	7	9

5.1.2.3 水土保持投资估算编制方法

(1) 工程措施

工程措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制。

(2) 植物措施

植物措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制。

(3) 监测措施

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革 全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号)“编制水土保持方案报告书的项目, 应当依法开展水土保持监测工作”。本工程编制水土保持方案报告表, 建设单位可自行开展水土保持监测工作。本方案不计列水土保持监测费。

(4) 施工临时措施

①临时防护工程

临时防护工程指施工期为防止水土流失采取的临时防护措施, 按设计工程量乘以单价编制。

②其他临时工程

其他临时工程按第一至三部分投资合计的 1.0%~2.0% 计列, 本工程取 2.0%。

(5) 独立费用

①建设管理费：按第一至四部分（工程措施、植物措施、监测措施和临时措施）投资合计的 2%计算。

②科研勘测设计费：包括工程科学研究试验费、勘测设计费及方案编制费。本方案不计列科学研究试验费、勘测设计费，根据《四川省水利水电工程概(估)算编制规定》并结合实际情况计列方案编制费。

③工程建设监理费：本工程水土保持工程规模较小，纳入主体工程一并监理，本方案不计列此部分费用。

④水土保持设施验收报告编制费：根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（办水保[2017]365号）仅计列水土保持设施验收报告编制费，根据《四川省水利水电工程概(估)算编制规定》并结合实际情况计列。

⑤招标代理服务费：本工程水土保持工程规模较小，纳入主体工程一并招标，本方案不计列此部分费用。

⑥经济技术咨询费：本工程水土保持工程规模较小，纳入主体工程一并进行，本方案不计列此部分费用。

(5) 预备费

基本预备费按第一至五部分（工程措施费、植物措施、监测措施、临时措施费、独立费用）之和的 10%计取。

(6) 水土保持补偿费

水土保持补偿费征收依据根据是《中华人民共和国水土保持法》第三十二条的规定：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。

根据《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格[2017]347号），第二条“（一）对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积每平方米 1.3 元一次性计征。（二）开采矿产

资源的，建设期间，按照征占用土地面积一次性计征，具体收费标准按照本条第一款执行。开采期间，石油、天然气以外的矿产资源按照开采量（采掘、采剥总量）每立方米 0.3 元计征。石油、天然气根据油、气生产井（不包括水井、勘探井）占地面积按年征收，每口油、气生产井占地面积按不超过 2000 平方米计算；对丛式井每增加一口井，增加计征面积按不超过 400 平方米计算，每平方米每年收费 1.4 元。”

因此，本工程水土保持补偿费按照征占用土地面积一次性计征，标准为 1.3 元/m²。

5.1.2.4 水土保持投资概述

本工程水土保持工程总投资 14.44 万元，其中主体设计水保投资为 2.2 万元，水土保持新增投资 12.24 万元。新增投资中，工程措施费用 0 万元，植物措施费用 0 万元，临时措施费用 1.69 万元，独立费用 8.78 万元，基本预备费 1.05 万元，水土保持补偿费 0.72 万元（7150 元）。总估算见表 5.1-4，监测措施估算表见表 5.1-5，临时措施估算见表 5.1-6，独立费用见表 5.1-7，水土保持补偿费计算表见表 5.1-8，分年度投资见表 5.1-9。

5 水土保持投资估算及效益分析

表 5.1-4 总估算表 (单位: 万元)

序号	工程或费用名称	建安 工程 费	设备 费	植物 措施 费	独立 费用	主体 设计	方案 新增	合计
	第一部分: 工程措施	2.2				2.2		2.2
一	主体工程防治区	2.2				2.2		2.2
	第二部分: 植物措施			0			0	0
一	主体工程防治区			0			0	0
	第三部分: 监测措施							0
	第四部分: 临时措施	1.69					1.69	1.69
一	主体工程防治区	1.69					1.69	1.69
二	其它临时工程	0.04					0.04	0.04
	第五部分: 独立费用				8.78		8.78	8.78
一	建设管理费				0.03		0.03	0.03
二	科研勘测设计费				4.75		4.75	4.75
三	工程建设监理费				0.00		0.00	0.00
四	水土保持设施验收报告编制费				4.00		4.00	4.00
五	招标代理服务费				0.00		0.00	0.00
六	经济技术咨询费				0.00		0.00	0.00
	第一至五部分合计	3.89		0	8.78	2.20	10.47	12.67
	基本预备费						1.05	1.05
	静态总投资						11.52	13.72
	水土保持补偿费						0.72	0.72
	水土保持总投资	3.89		0	8.78	2.2	12.24	14.44

表 5.1-5 工程措施估算表

序号	项目名称	单位	数量		单价 (元)	投资 (万元)		合计
			主体设计	方案 新增		主体设计	方案 新增	
	第一部分: 工程措施					2.20		2.20
一	主体工程防治区					2.20		2.20
1.1	排水沟	m	139		158	2.20		2.20

5 水土保持投资估算及效益分析

表 5.1-5 监测措施估算表

序号	项目名称	单位	数量		单价 (元)	投资 (万元)		
			主体设计	方案新增		主体设计	方案新增	合计
	第三部分: 监测措施							

注: 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革 全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号)“编制水土保持方案报告书的项目, 应当依法开展水土保持监测工作”。本工程编制水土保持方案报告表, 可不开展水土保持专项监测工作, 应履行水土流失防治责任和义务。

表 5.1-6 临时措施估算表

序号	项目名称	单位	数量		单价 (元)	投资 (万元)		
			主体设计	方案新增		主体设计	方案新增	合计
	第四部分: 临时措施							
一	主体工程防治区						1.69	1.69
1	彩条布	m ²		2500	6.75		1.69	1.69
二	其它临时工程						0.00	0.00

表 5.1-7 独立费用估算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	计算依据	合价 (万元)
	第五部分: 独立费用				8.78
一	建设管理费	万元		按第一至四部分投资合计的 2% 计算	0.03
二	科研勘测设计费	项	1	根据实际情况计列方案编制费	4.75
三	工程建设监理费	项	1	不计列	0.00
四	水土保持设施验收报告编制费	项	1	参考收费文件并结合项目实际情况计列	4.0
五	招标代理服务费			不计列	0.00
六	经济技术咨询费			不计列费用	0.00

表 5.1-8 水土保持补偿费计算表

序号	项目	面积 (m ²)	单价 (元/m ²)	合价 (元)
1	主体工程区	5500	1.3	7150
	合计	5500	/	7150

表 5.1-9 分年度投资估算表

序号	工程或费用名称	总投资 (万元)	分年度投资 (万元)
	第一部分: 工程措施	2.2	2.2
一	主体工程防治区	2.2	2.2
	第二部分: 植物措施	0	0
一	主体工程防治区	0	0
	第三部分: 监测措施	0	0
	第四部分: 临时措施	1.69	1.69
一	主体工程防治区	1.69	1.69

5 水土保持投资估算及效益分析

二	其它临时工程	0.04	0.04
	第五部分：独立费用	8.78	8.78
一	建设管理费	0.03	0.03
二	科研勘测设计费	4.75	4.75
三	工程建设监理费	0	0
四	水土保持设施验收报告编制费	4	4
五	招标代理服务费等	0	0
六	经济技术咨询费	0	0
	第一至五部分合计	12.67	12.67
	基本预备费	1.05	1.05
	静态总投资	13.72	13.72
	水土保持补偿费	0.72	0.72
	水土保持总投资	14.44	14.44

5.2 效益分析

5.2.1 效益评价原则

水土保持效益分析以区域生态规划和经济可持续发展为原则，本工程水土保持方案以减轻和控制责任范围内的水土流失为目的，落实国家及地方有关水土保持法律法规的要求，通过水土保持工程措施、植物措施和临时措施的实施，着重分析水土保持方案实施后产生的保水保土、改善生态环境、促进可持续发展方面的效益和作用。

5.2.2 分析计算方法和内容

(1) 保土效益分析

水土保持综合治理所能产生的效益主要有拦泥拦沙效益、保水保土效益、生态效益和社会效益。本方案水土保持综合治理措施效益计算与评价，参考《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008），并结合类似工程的防治效果，分析计算本工程建设期的保土量、土壤侵蚀控制程度以及产生的生态效益、社会效益。

本工程造成地表扰动面积 0.55hm^2 ，通过完善的水土保持措施体系的实施，可以治理水土流失面积 0.55hm^2 ，林草植被面积 0hm^2 ，将降低在建设过程中的土壤侵蚀模数，可以将土壤侵蚀模数控制在容许流失量之内。根据对类似工程在采取完善水土保持措施后的调查，建设期间土壤侵蚀模数可以控制在

2000t/(km²·a)左右,试运行期土壤侵蚀模数可以控制在500t/(km²·a)以内。据此推算,本工程建设期可减少水土流失量10t。

(2) 社会效益分析

本工程位于珙县,通过认真贯彻水土保持法规,因地制宜地采取水土保持预防措施、治理措施、监督检查等措施,使工程建设可能造成的水土流失及危害降到最低限度,可保障工程顺利建设,改善生态环境,对于工程良好运行具有良好的社会效益。

5.2.3 水土保持方案防治效果分析

根据《生产建设项目水土保持技术标准》,水土保持狭义概念是以减轻和控制水土流失为主,通过方案实施,使工程建设区内的水土流失和弃渣得到有效治理、损坏的水土保持设施得到恢复、原有的土壤侵蚀也得到一定程度的控制。水土保持效益指标包括扰动水土流失总治理度,土壤流失控制比,渣土防护率,表土保护率,林草植被恢复率,林草覆盖率。开发建设项目水土保持6项基本指标定义如下。

$$\text{水土流失治理度}(\%) = \frac{\text{水土流失治理达标面积}}{\text{水土流失总面积}} \times 100\%$$

$$\text{土壤流失控制比}(\%) = \frac{\text{容许土壤流失量}}{\text{治理后每平方公里年平均流失量}} \times 100\%$$

$$\text{渣土防护率}(\%) = \frac{\text{实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量}}{\text{永久弃渣和临时堆土总量}} \times 100\%$$

$$\text{表土保护率}(\%) = \frac{\text{保护的表土数量}}{\text{可剥离表土总量}} \times 100\%$$

$$\text{林草植被恢复率}(\%) = \frac{\text{林草植被面积}}{\text{可恢复林草植被面积}} \times 100\%$$

$$\text{林草覆盖率}(\%) = \frac{\text{林草植被面积}}{\text{总面积}} \times 100\%$$

说明:

- (1) 各种面积均为项目建设区范围内相应的垂直投影面积。
- (2) 水土保持措施面积=工程措施面积+植物措施面积。
- (3) 水土流失总面积=项目建设区面积-永久建筑物面积-场地道路硬化面积-建设区内未扰动的微度侵蚀面积。
- (4) 林草植被面积为采取林草措施的面积。

5 水土保持投资估算及效益分析

(5) 可恢复林草植被面积为目前经济、技术条件下可恢复林草植被的面积。

(6) 乔、灌、草结合的立体防护措施面积不重复计算。

(7) 土地整治按其利用方向计算面积，整治后造林种草的计入植物措施面积，复耕的计入工程措施面积。

(8) 矿山开采和水工程项目在计算各项防治指标值时，其露天开采的采区面积、水工程的水域面积可在防治责任范围面积中扣除；恢复耕地面积在计算林草覆盖率时可在防治责任范围面积中扣除。

六项指标较全面地反映了因工程建设造成水土流失的治理情况以及区域生态环境的恢复状况。设计水平年六项指标情况见表 5.2-1，六项指标实现情况见表 5.2-2。通过水土保持工作的开展，六项防治指标均能达到要求，水土保持工程的防治效果明显。

表 5.2-1 设计水平年六项指标情况表

防治分区	合计	主体工程
项目建设区面积 (hm ²)	0.55	0.55
扰动地表面积 (hm ²)	0.55	0.55
永久构筑物占地面积/硬化面积 (hm ²)	0.55	0.55
水土流失面积 (hm ²)	0.55	0.55
水土流失治理达标面积 (hm ²)	0.55	0.55
容许土壤流失量 t/(km ² .a)	500	500
方案实施后土壤侵蚀模数 t/(km ² .a)	500	500
永久弃渣和临时堆土量 (万 m ³)	0.05	0.05
实际挡护量 (含临时堆土, 万 m ³)	0.05	0.05
保护的表土数量 (万 m ³)	/	/
可剥离表土总量 (万 m ³)	/	/
可恢复林草植被面积 (hm ²)	0	0
植物措施面积 (hm ²)	0	0
工程措施面积 (hm ²)/复耕面积	0	0
水土保持措施总面积 (hm ²)	0	0

表 5.2-2 六项指标达标情况表

指标	设计水平年防治目标	治理结果	是否达标
水土流失治理度(%)	97	100	达到
土壤流失控制比(%)	1.0	1.0	达到
渣土防护率	92	100	达到
表土保护率(%)	/	/	达到
林草植被恢复率(%)	96	100	达到
林草覆盖率(%)	/	/	达到

6 水土保持管理

6.1 组织管理

为了保证方案提出的各项水土保持措施顺利实施,建设单位应设立专门的水土保持工程管理小组,抽调专业技术人员负责水土保持工作的管理和组织实施工作,并组织相应人员培训,强化水土保持意识,明确水土流失的防治责任和义务、协调各项水土保持措施与主体工程同步实施,同期完成,并积极配合水行政主管部门监督、检查。

建设单位应对水土保持方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、水土保持效益指标以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

6.2 后续设计

主体工程下阶段设计文件中,应将批复的水土保持防治措施和投资估算纳入,并单独成章,应具体落实水土保持方案措施。若存在涉及《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)》(办水保[2016]65号)中提及的重大变更行为时应重新编报水土保持方案。

6.3 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革 全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号)“编制水土保持方案报告书的项目,应当依法开展水土保持监测工作”。本工程编制水土保持方案报告表,建设单位可自行开展水土保持监测工作。

6.4 水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革 全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号),“凡主体工程开展监理工作的项目,应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中,征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目,应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师;征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目,应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。”

本工程占地面积 0.55hm^2 ，水土保持工程较简单，水土保持监理可纳入主体监理一并实施。建设单位把水土保持工程监理列入工程监理任务，在监理合同中应明确水土保持工程监理任务。

在建设过程中，建设单位应加强水土保持工程的建设监理工作，形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价，保证进度，提高水土保持工程的施工质量。由水土保持监理工程师对水土保持工程的合同管理、投资、工期和质量进行控制，并协调有关各方的关系，并对水土保持方案实施阶段的招标工作、勘测设计、施工等建设全过程实施监理。

6.5 水土保持施工

本工程新增水土保持工程较简单，水土保持施工可纳入主体施工一并进行。施工期应严格控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动。施工时设立保护地表及植被的警示牌，施工过程应注意保护表土与植被。根据主体工程施工进度和本方案的要求，合理安排水土保持工程的进度安排。

6.6 水土保持设施验收

建设单位和施工单位应定期检查项目建设区水土流失防治情况及对周边的影响，并接受水行政主管部门的监督管理。

《中华人民共和国水土保持法》第二十七条规定：“依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。”工程竣工验收前必须完成水土保持设施专项验收工作。根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（办水保[2017]365号），依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当依据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。水土保持设施验收报告编制完成后，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收

合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后，生产建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。水土保持工程验收后，应由项目法人负责对项目建设区的水土保持设施进行后续管护与维修，运行管护维修费用从生产运行费中列支。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号），实行承诺制或者备案制管理的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。

7 结论及建议

7.1 结论

从水土保持的角度综合分析,本工程除涉及乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区外,不存在约束性因素,在做好各项水土保持工作的情况下,因工程建设引起的水土流失可以得到有效治理,水土流失强度可以控制在容许范围之内,因此项目建设是可行的。

7.2 建议

- (1) 施工过程中,加强施工管理,尽量减小对地表的占压和扰动面积。
- (2) 主体工程在施工时应严格按照施工组织设计中的内容进行施工,尽量减少扰动地表面积。
- (3) 做好土石方堆放过程中的水土保持工作,避免造成水土流失及对周边环境造成影响。
- (4) 建设单位在本工程施工期间应配合水行政主管部门水土保持监督检查。
- (5) 工程建设完成后应立即开展水土保持设施自验工作。

8 附表、附件和附图

8.1 附表

水土保持方案报告表投资估算附表

8.2 附件

附件 1 立项文件

8.3 附图

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目区水系图

附图 3 项目总平面布置图

附图 4 项目区土地利用现状图

附图 5 项目区土壤侵强度分布图

附图 6 水土流失防治责任范围、防治分区及水土保持措施布置图
